北海道新幹線（八雲地域）情報コーナー

2030年度末に札幌までの開業を目指す北海道新幹線に関わる情報を随時お知らせします。

北海道新幹線建設工事の進ちょく状況について

建設主体である独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局が八雲鉄道建設所管内において実施しているトンネル工事の進ちょく状況を紹介します。

北海道新幹線八雲町内工事区間概要図

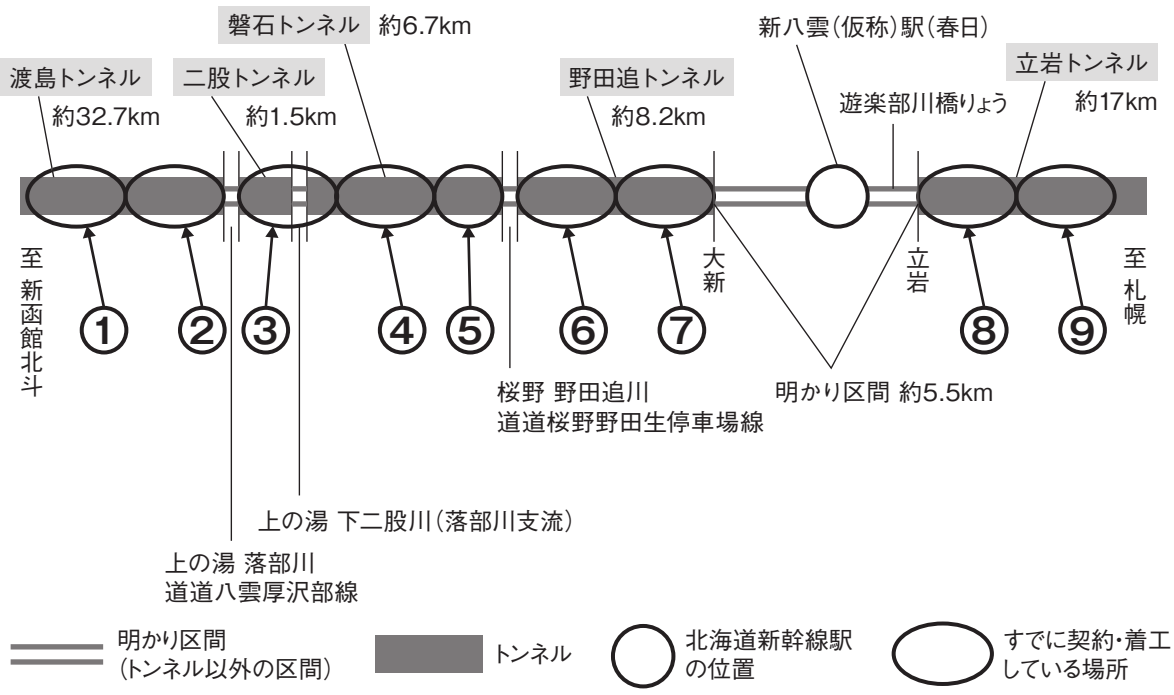

令和3年5月1日現在

八雲鉄道建設所管内工事一覧

	件　名	工　期	工事事業者	主たる工種	進ちょく状況
①	北海道新幹線、渡島トンネル（上二股）	平成29年7月14日～令和7年3月13日	清水・岩倉・新谷・高橋JV	トンネル 4,540m 斜坑 1,220m	本坑掘削51m 斜坑掘削1,220m
②	北海道新幹線、渡島トンネル（上ノ湯）他	平成29年11月28日～令和7年1月27日	安藤ハザマ・若築・堀口・斉藤JV	トンネル 5,270m 路盤工 45m	本坑掘削1,372m
③	北海道新幹線、二股トンネル外1箇所	平成30年8月7日～令和5年9月6日	戸田・りんかい日産・田中・鈴木東建JV	トンネル 3,095m 斜坑 140m	本坑掘削1,507m 斜坑掘削140m
④	北海道新幹線、磐石トンネル（北）他	平成29年10月4日～令和5年7月3日	西松・淺沼・中山・岸本JV	トンネル 3,150m 路盤工 458m	本坑掘削70m 斜坑掘削458m
⑤	北海道新幹線、祭礼トンネル他	平成30年3月2日～令和4年6月1日	三井住友・村本・中塚JV	トンネル 1,980m 斜坑 271m	本坑掘削1,354m 斜坑掘削271m
⑥	北海道新幹線、野田追トンネル（南）他	平成28年1月25日～令和4年3月24日	東急・東鉄・廣野・草野JV	トンネル 3,675m 斜坑 270m	本坑掘削2,946m 斜坑掘削270m
⑦	北海道新幹線、野田追トンネル（北）他	平成26年12月12日～令和3年11月11日	フジタ・株木・石山・砂子JV	トンネル 4,490m 路盤工 40m	本坑掘削3,992m
⑧	北海道新幹線、立岩トンネル（立岩）他	平成26年3月20日～令和4年12月22日	戸田・伊藤・新太平洋・北海道軌道施設JV	トンネル 5,015m 路盤工 20m	本坑掘削4,537m
⑨	北海道新幹線、立岩トンネル（山崎）	平成28年2月29日～令和6年2月28日	大林・青木あすなろ・松本・阿部JV	トンネル 4,960m 斜坑 1,672m	本坑掘削1,184m 斜坑掘削1,672m

【問い合わせ先】・新幹線推進室　☎0137－62－2226
・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構北海道新幹線建設局八雲鉄道建設所
☎0137－66－5620
